
Проект «Пихта М»

С мансардой · 79,7 м² · 8 × 6 м

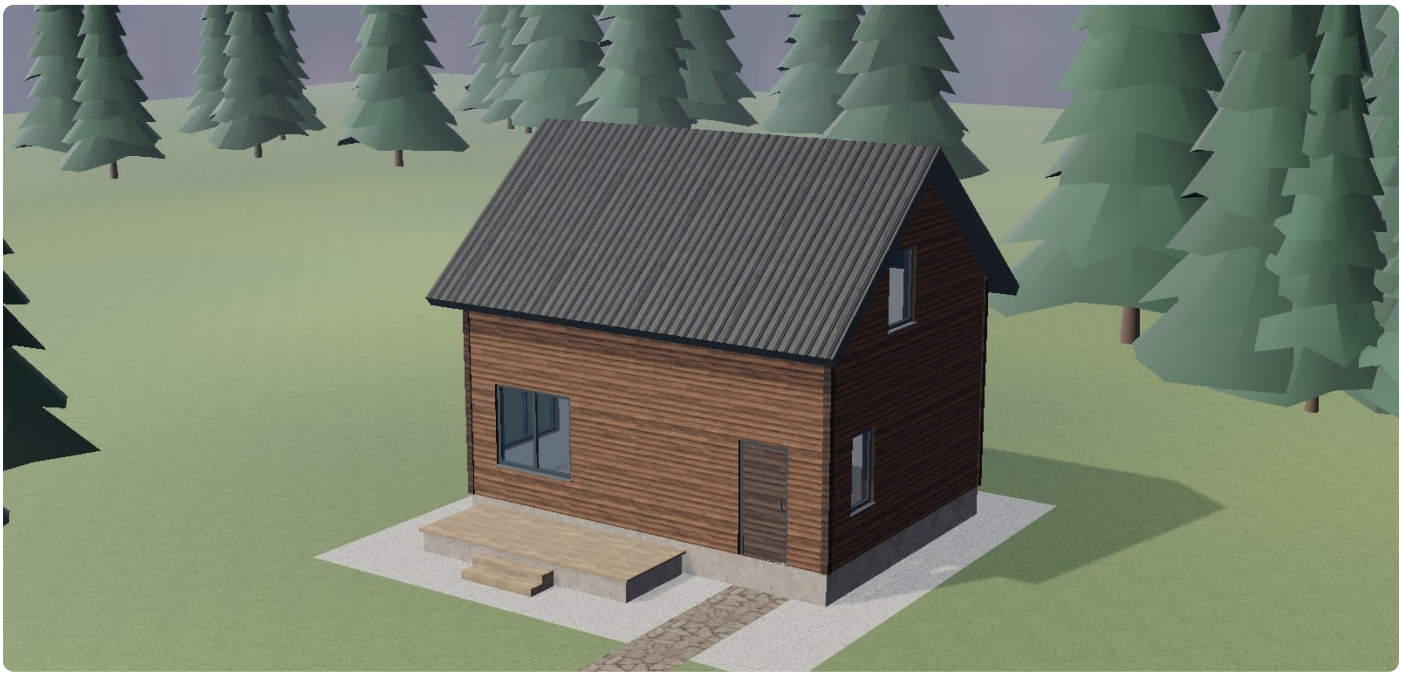

Стоимость	Комплектация	Срок	Общая площадь
3 289 856 ₽	Тёплый контур	12 недель	79,7 м²

Конфигурация

Этажность	С мансардой
Габариты	8 × 6 м
Планировка	Как в проекте
Кровля	Двускатная
Отделка фасада	Имитация бруса
Цвет фасада	Орех
Окна	Обычные
Терраса	1,8 м
Утепление стен	150 мм
Инженерные системы	Электрика, Водоснабжение и канализация, Отопление
Комплектация	Тёплый контур


Смета по статьям

Статья	Объём	Цена	Сумма
Фундамент			**288 400 ₽**
Винтовые сваи 108 мм с оголовками	28 шт.	7 900 ₽	221 200 ₽
Обвязка из клеёного бруса	28 м	2 400 ₽	67 200 ₽
Домокомплект и сборка каркаса			**1 538 002 ₽**
Перекрытие пола с утеплением 200 мм	41,48 м²	6 800 ₽	282 064 ₽
Каркас стен 50×150	132,7 м²	5 900 ₽	782 930 ₽
Межэтажные перекрытия	41,48 м²	5 200 ₽	215 696 ₽
Стропильная система	80,41 м²	3 200 ₽	257 312 ₽
Утепление и мембраны			**324 001 ₽**
Утепление стен 150 мм	132,7 м²	1 450 ₽	192 415 ₽
Утепление скатов мансарды 200 мм	62,66 м²	2 100 ₽	131 586 ₽
Кровля			**269 589 ₽**
Фальцевая кровля с подкладочным ковром	80,41 м²	2 900 ₽	233 189 ₽
Водосточная система	28 м	1 300 ₽	36 400 ₽
Окна и двери			**289 660 ₽**
Окна, деревоалюминий, двухкамерный стеклопакет	14,04 м²	16 500 ₽	231 660 ₽
Входные двери с терморазрывом	1 шт.	58 000 ₽	58 000 ₽
Фасад			**338 024 ₽**
Имитация бруса с окраской	116,56 м²	2 900 ₽	338 024 ₽
Терраса			**99 360 ₽**
Терраса из лиственницы на сваях	8,64 м²	11 500 ₽	99 360 ₽
Доставка и организация стройки			**142 820 ₽**
Доставка домокомплекта и бытовка	1 компл.	95 000 ₽	95 000 ₽
Технадзор и уборка площадки	79,7 м²	600 ₽	47 820 ₽

Итого **3 289 856 ₽**

График строительства

Проект и производство — 6 недель Работы на участке — 10 недель

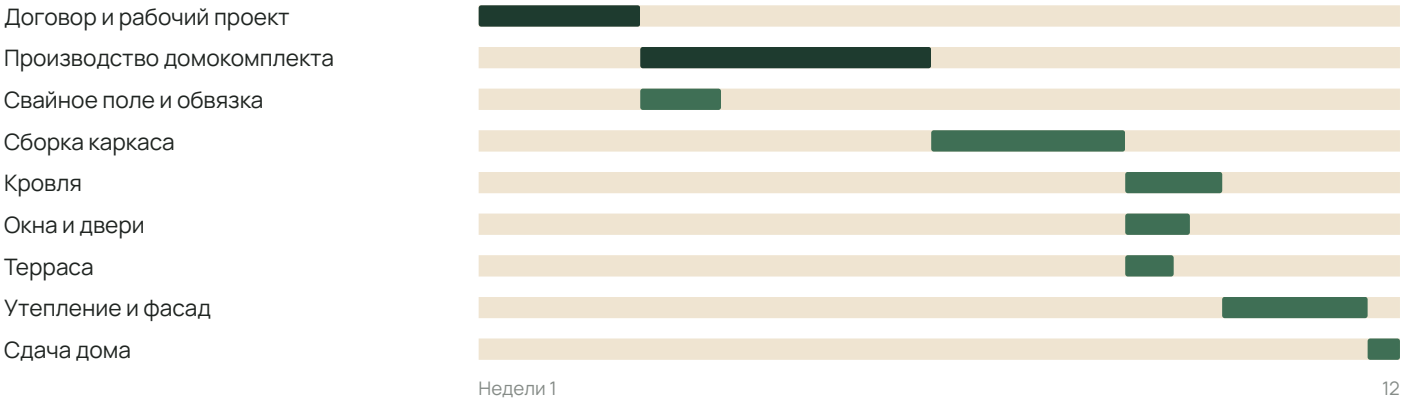

Конфигурация на сайте

http://localhost:46100/c/xxbvu49yt28z

Наведите камеру телефона на QR-код — откроется 3D-модель именно этой конфигурации.

Цены зафиксированы на 3 октября 2026 г. по тарифу редакции 19 и включают материалы, доставку и монтаж. Окончательная смета — после выезда на участок.

Демо-версия. Компания и данные вымышленные.
